

Piaseczno, dnia 2017-08-04, 2017-08-11



PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.347.2017
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady koordynacyjnej: sieć energetyczna, gazowa, teletechniczna, kanalizacja deszczowa

Lokalizacja:

gmina: **PIASECZNO**

obręb: ~~10,34,28~~ Runów PGR, Głosków, Pęchery

ulica : **ul. Millenium**

nr ew. działki: **wg zał. mapowego stanowiącego integralną część protokołu**

Wnioskodawca: **VEGMAR JAKUB KRAWCZYK, ul. Konarskiego 12A , 05-500 PIASECZNO ,**

upoważniony przez **Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego**

W dniu 2017-08-04, w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbyło się zebranie narady koordynacyjnej dotyczące w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: **GEK.6630.347.2017**

Do dokumentacji nie zostały dołączone wnioski o koordynację robót budowlanych o których mowa w art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Z up. Starosty Piaseczyńskiego
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Lp	Imię i Nazwisko INSTYTUCJA	Stanowisko	Podpis
1.	Małgorzata Andrasik..... Podinspektor Wydziału Geodezji i Katastru PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ	Przebieganie pod nadzorem ochrony punktów osłony geodezyjnej oraz z uwzględnieniem stanowiska PGE Dystrybucja SA, PGE Spółki Gazownictwa	
2.	Bogdan Kalasa PGE DYSTRYBUCJA S.A.	NIE UZGODNIONO/UZGODNIONO z uwagami w protokole bez uwag 04 SIE 2017 11 SIE 2017	
3.	Pawel Rutkowski NETIA S.A.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się 1009	
4.	ORANGE POLSKA S.A.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
5.	JERZY KŁÓSEK POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z SIECIĄ GAZOWĄ STOSOWAĆ OSTROŻNIE - UZGODNIONO	
6.	GDDKA - ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W	Nie dotyczy	

ODPIS

gmina: **PIASECZNO**

obręb: ~~10~~ Runów PER, GOSKÓW, Pęchów

ulica : **ul. Millenium**

7.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Nie dotyczy	
8.	ZARZĄDCA DRÓG POWIATOWYCH	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
9.	Wroclawski Rejon GMINA - PIASECZNO m.	UZGODNIONO BEZ UWAG 14.08.2017	
10.	WOJ.ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH INSPEKTORAT W PIASECZNE	Nie dotyczy	
11.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZE KALWARII	Nie dotyczy	
12.	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.	Nie dotyczy	
13.	st. kier. J. Zygota CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH	UZGODNIONO z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych z uwagami / bez uwag Dnia	
14.	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PIASECZNO	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
15.	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM	Nie dotyczy	

W naradzie koordynacyjnej brały udział podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z lokalizacją projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

UWAGI CZŁONKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznym prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wiedzy technicznej zawartej w PN/E-05125.
Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu istniejących urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.
O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić Inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie RE Jeziorna tel. 22 701 32 00 lub 22 701 32 22.
Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna.

Zabrania się wykonywania prac ziemnych w odległości mniejszej niż 1m od słupów linii elektroenergetycznych nN-0.4kV, SN-15kV i SN-110kV.
Prace ziemne w strefie zbliżenia do słupów (1-2m) wykonywać ręcznie bez naruszania posadowienia fundamentów słupów pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna z zachowaniem wiedzy technicznej zawartej w PN-5100 i t.j. napowietrzna na czas prowadzenia prac wyłączyć spod napięcia.

04 SIE 2017

Protokołem rozstrzygnięć projektu z dnia 08.08.2017r.

Uwaga nr. 1
po usunięciu istniejącego słupa oświetlenia ulicznego nie zapewni alternatywnej lokalizacji słupa czy to oznaczona brach

ODPIS
Z up. Starosty Piaseczyńskiego
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
Małgorzata Andrasiak
Podinspektor Wydziału Geodezji i Katastru


Ad 1. Kolizje z punktami osnowy geodezyjnej.
W miarę możliwości do czasu geodezyjnych
prac zostaną wykonane ręcznie, w miarę
ich zmierzania zostaną skorygowane.
Wykonawca robót zobowiązany będzie do wykonania
stwierdzonych prac.

16.08.2017r.
Kamil Piastun

ODPIS

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH

skala 1:20

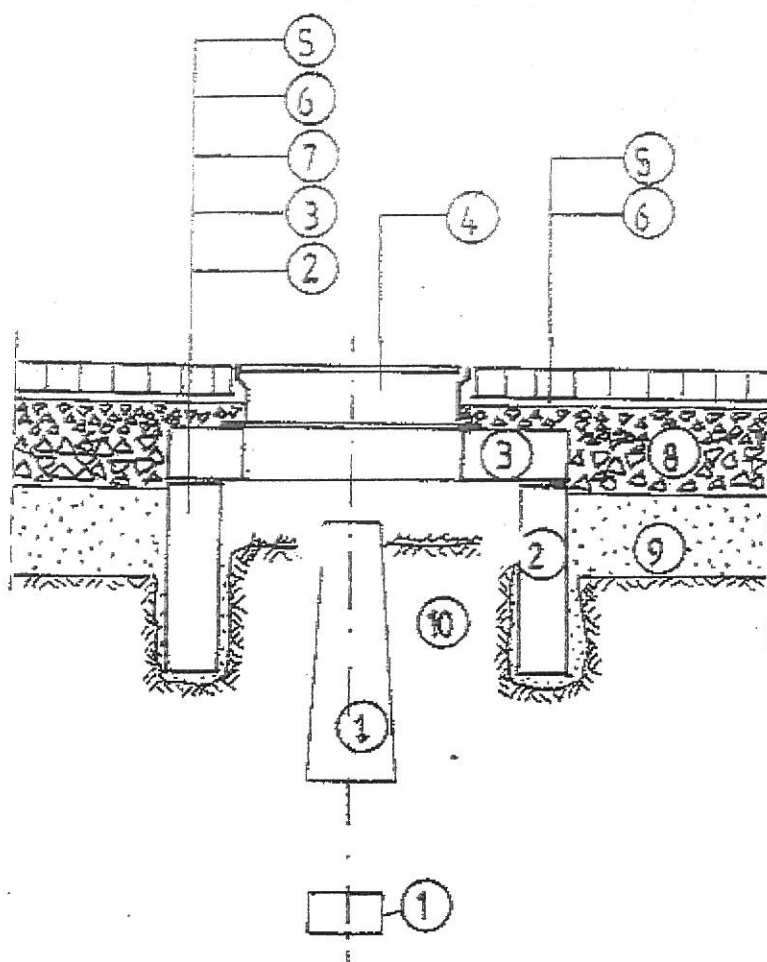

1. bloki betonowe punktu geodezyjnego;
2. krąg żelbetowy min. $\Phi 80$, wkopany ręcznie;
3. betonowa płyta pokrywowa;
4. uliczny właz żeliwny, typ ciężki;
5. betonowa kostka brukowa, grubość 8cm;
6. podsypka cementowo-piaskowa, grubość 3cm;
7. kliniec kamienny, warstwa grubości 6cm;
8. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość 23cm;
9. nasyp z gruntu przepuszczalnego;
10. nienaruszony grunt rodzimy.

Po wykonaniu robót pomiarowych, przed rozpoczęciem robót przygotowawczych i ziemnych, należy zabezpieczyć występujące na terenie budowy punkty geodezyjne.

Ostonę należy wykonać w formie studzienki o średnicy min. $\Phi 80$, przykrytej pokrywą z włazem żeliwnym. Studzienkę osadzić w wykopie wykonanym ręcznie, bez naruszania gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie betonowych bloków punktu geodezyjnego.

